



การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2568



สัญญาที่ 1

ช่วง
เด่นชัย-จาว

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

38.915%

แผนงานสะสม

41.234%

ช้ากว่าแผนงาน

-2.319%

สัญญาที่ 2

ช่วง
จาว-เชียงใหม่

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

48.062%

แผนงานสะสม

44.647%

เร็วกว่าแผนงาน

+3.415%

สัญญาที่ 3

ช่วง
เชียงใหม่-เชียงใหม่

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม

37.767%

แผนงานสะสม

34.325%

เร็วกว่าแผนงาน

+3.442%



ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ

ความก้าวหน้า
งานก่อสร้างสะสม


41.986%

แผนงานสะสม

40.655%

ผลงานสะสม
เร็วกว่าแผน

+1.331%

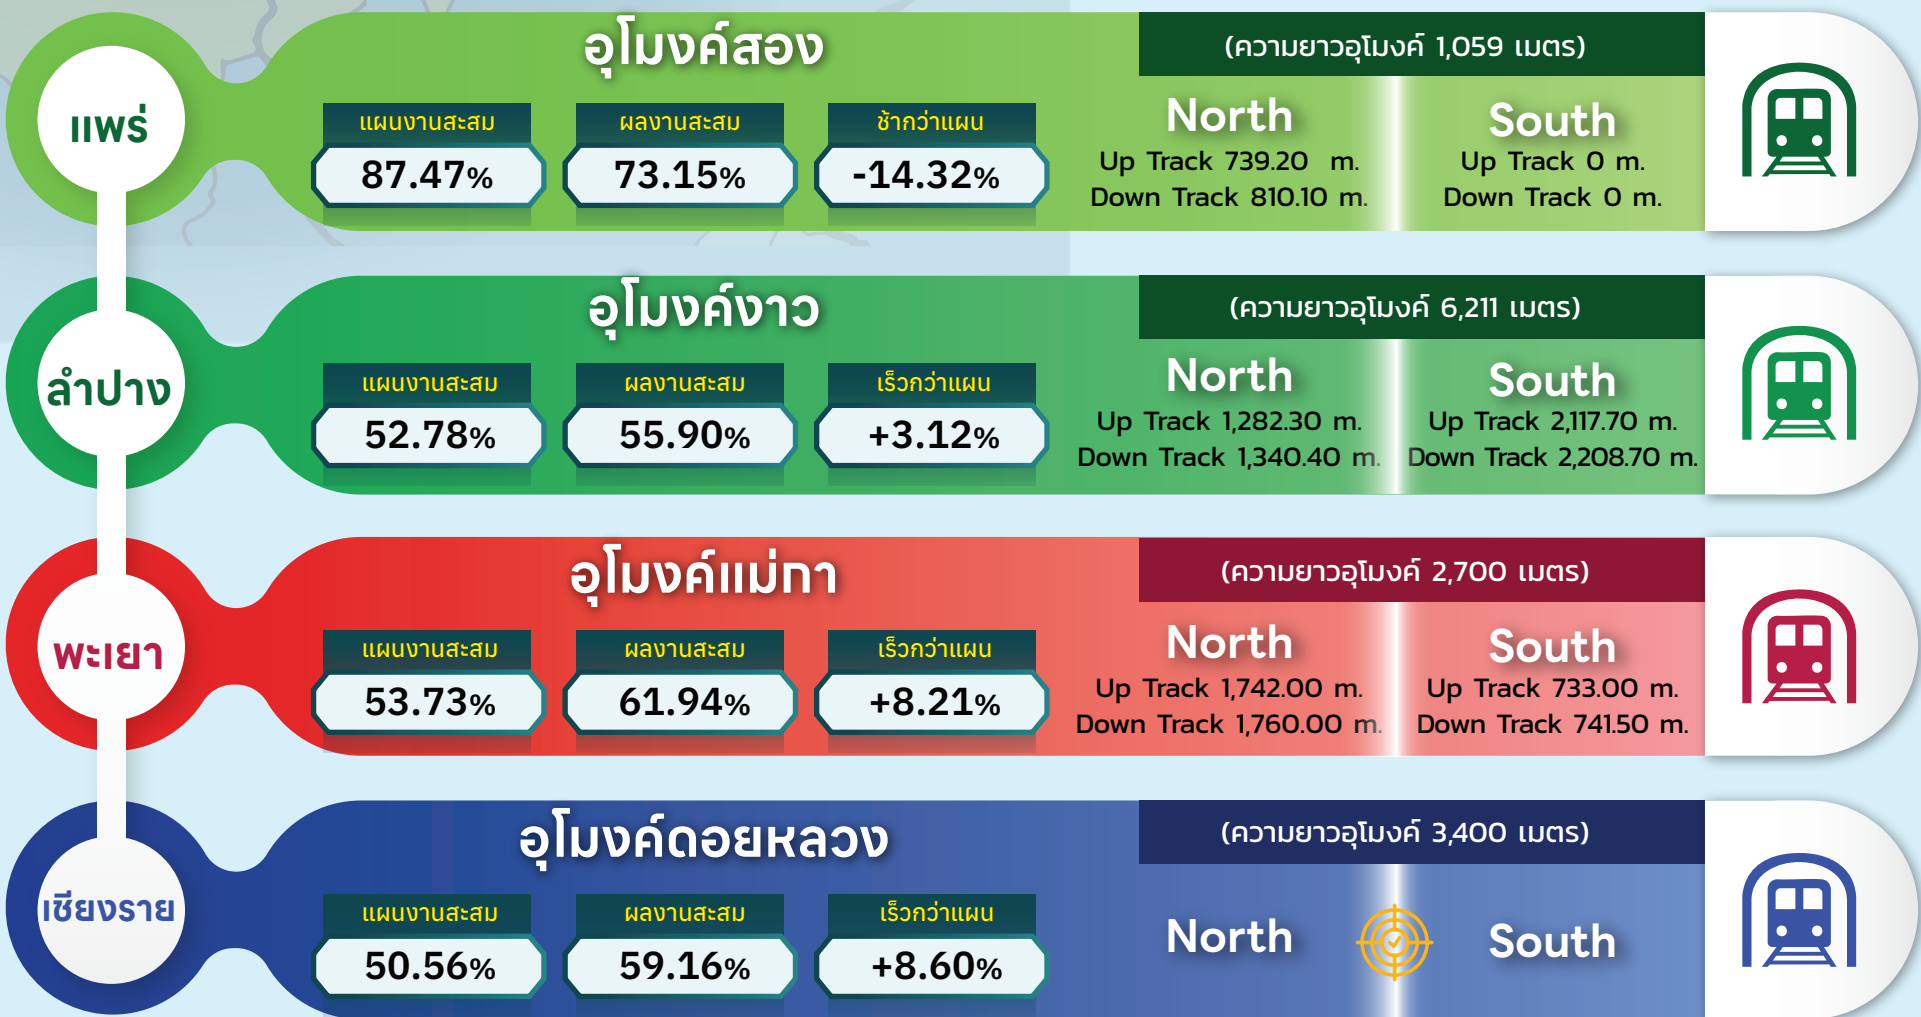

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่
