


การรถไฟแห่งประเทศไทย

# ความก้าวหน้างานก่อน เดือนเมษายน 2569

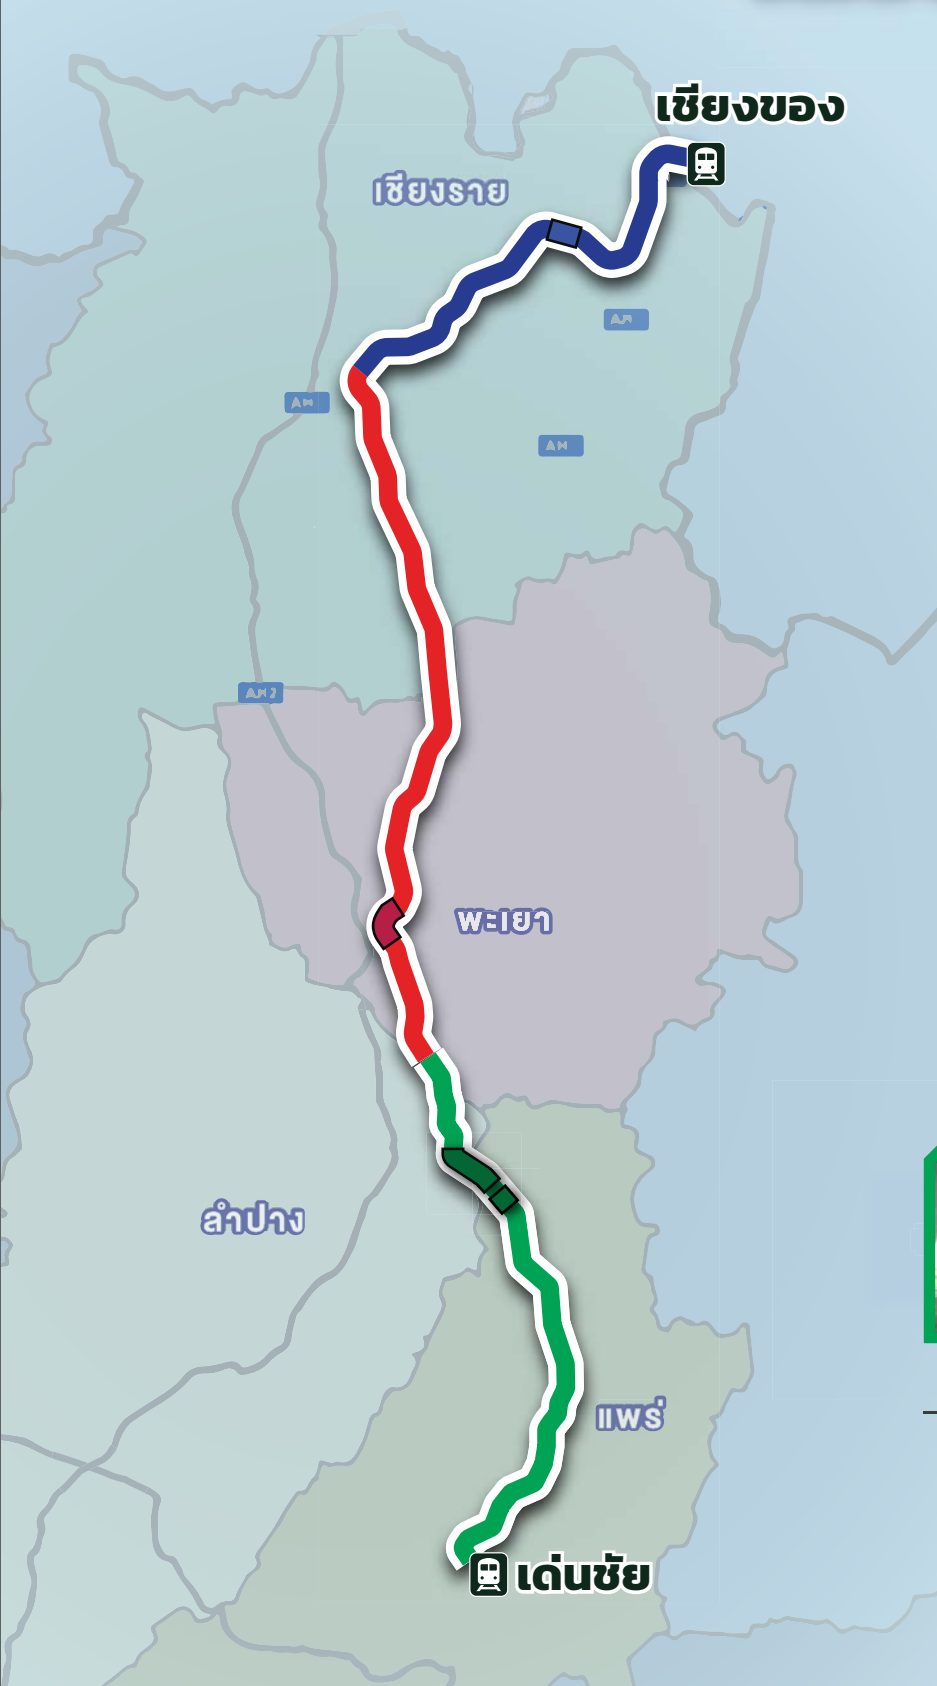

## สัญญาที่ 1

ช่วง  
เด่นชัย-จาง

ความก้าวหน้า  
งานก่อสร้างสะสม

**62.012%**

แผนงานสะสม

**68.306%**

ช้ากว่าแผนงาน

**-6.294%**



## สัญญาที่ 2

ช่วง  
จาง-เชียงใหม่

ความก้าวหน้า  
งานก่อสร้างสะสม

**64.611%**

แผนงานสะสม

**62.271%**

เร็วกว่าแผนงาน

**+2.339%**



## ความก้าวหน้ารวม

ความก้าวหน้า  
งานก่อสร้างสะสม

**61.619%**

แผนงานสะสม

**62.311%**



## อุโมงค์สอง

แผนงานสะสม

**92.17%**

ผลงานสะสม

**66.61%**

ช้ากว่าแผน

**-25.57%**

(ความยาวอุโมงค์)

North

